



**รายงานการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา**



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ (รายละเอียดเอกสารที่ปรากฏแนบท้ายนี้)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายนิยมชัย รอดชู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

## คำนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ได้จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 (3) “รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง เพราะจะทำให้ทราบข้อมูลต่าง ๆ ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา และจะนำข้อมูลที่ได้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามาใช้ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1
บทที่ 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา	7
บทที่ 3 การติดตามและประเมินผลการพัฒนา	8
แบบที่ 1 การกำกับจัดการแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์	
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป	9
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	9
ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับอุดหนุนเฉพาะกิจ	13
ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติการ	14
- การติดตามประเมินผลการดำเนินการโครงการ	15
- แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563	19
- รายงานผลการดำเนินงาน	30

## บทที่ 1

### บทนำ

#### 1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและการประเมินเป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาตรวจสอบว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ปัญหาหรืออุปสรรคของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจาก สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในตำบลหน้าเขา

#### 2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/ผู้บริหารกองทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลหน้าเขา หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

### 3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา จะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 28 ดังนี้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน
- 5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น คัดเลือก จำนวน 2 คน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกคนทำหน้าที่

เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและ อาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

#### ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดแนวทางและวิธีการ

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา


(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบฯ ต้องกำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยให้มีการประชุมกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพื้นที่สุ่มตรวจติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน เพื่อการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา และใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา และสรุปรายงานผลเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตตำบลโดยทั่วกันตามลำดับต่อไป

### การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

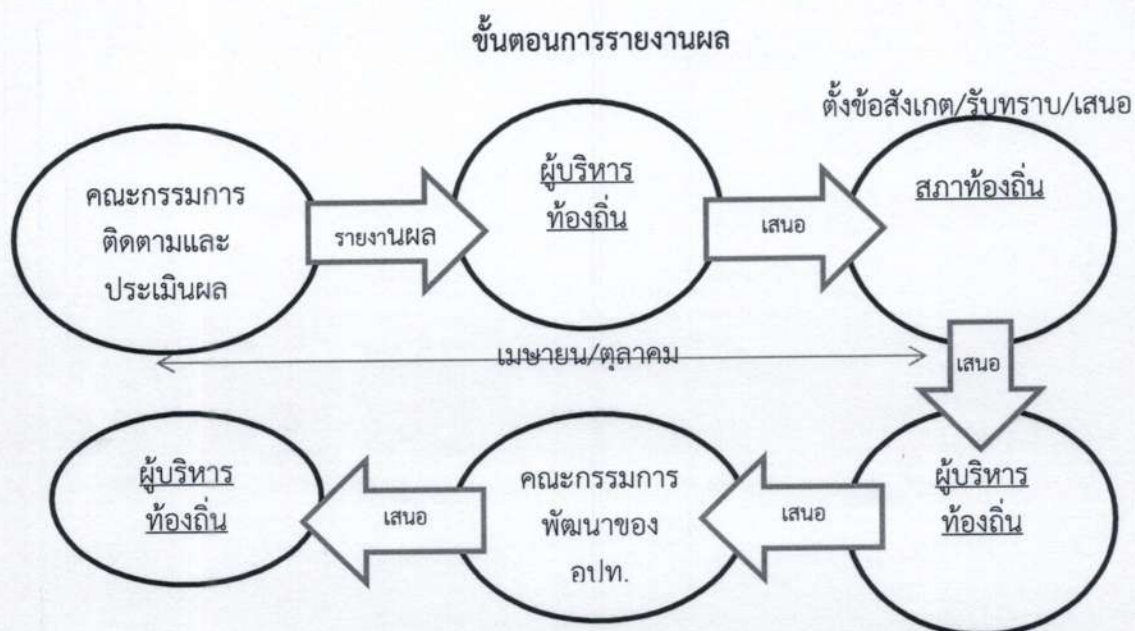

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบล ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอ

## วิธีการในการติดตามและประเมินผล

การติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจการที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานที่จะสามารถนำไปสู่การบรรลุแผนที่กำหนดไว้ได้ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน ได้แก่ การติดตามด้วยระบบ e-plan การติดตามการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานการประเมินผล

### 1) การกำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้ กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมทุกครั้งที่ทำเนิการแล้วเสร็จและสรุปเป็นรายปี และรายงานให้ผู้บริหารทราบ เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกครั้ง พร้อมสรุปผลในภาพรวมแล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำเสนอสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตตำบลทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีและปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน

### 2) เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาข้อมูลในระบบ e-plan ([www.dla.go.th](http://www.dla.go.th)) และ การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-laas ([www.dla.go.th](http://www.dla.go.th))

## 4. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสปีและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทันท่วงที ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลหน้าเขา

## บทที่ 2

### วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

#### 1. วิสัยทัศน์

*“โครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจเจริญก้าวหน้า”*

#### 2. พันธกิจ

ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปการสาธารณูปโภคและระบบสาธารณะให้มีความสะดวกและเพียงพอต่อความต้องการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ของตำบลให้สวยงามและน่าอยู่เพื่อรองรับการท่องเที่ยว พัฒนาการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การพัฒนาการบริหารกิจการที่ดี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมมากขึ้น อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

#### 3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอและสะอาด
ประชาชนมีไฟฟ้าและมีระบบสาธารณูปการใช้อย่างทั่วถึง	ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง
ประชาชนมีความเป็นอยู่และมีสุขภาพที่ดี	ประชาชนมีความรู้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ประชาชนได้รับการบริการที่ดีและประทับใจจากภาครัฐ	ประชาชนมีส่วนร่วม และมีบทบาทในการบริหาร
ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น	ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

#### 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา สามารถจำแนกออกเป็น 4 ด้านดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายพัฒนา คือ งานอุตสาหกรรมโยธา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ในพื้นที่ เช่น ถนน สะพาน รางระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม ท่อคอนกรีต เสริมเหล็ก แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ไฟฟ้าสาธารณะ ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารต่างๆ ฯลฯ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต โดยมีเป้าหมายพัฒนา คือ โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่างๆ เช่น การพัฒนาการศึกษาทุกระดับ การสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่น การส่งเสริมด้านสาธารณสุข งานสังคมสงเคราะห์ การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด รักษาความสงบภายใน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย เพื่อดำเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ฯลฯ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมาย การบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้ในป่าชุมชน ป่าสาธารณะ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ โครงการตามพระราชดำริฯ กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ โดยมีเป้าหมาย พัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร พัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน เพื่อการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

### บทที่ 3

## การติดตามและประเมินผลการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

สรุปผลรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน ซึ่งได้จากการติดตามผลการดำเนินงาน การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารงานและทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

#### แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว  
\*\*\*\*\*

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
<b>ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาส่วนท้องถิ่น</b>		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาความสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น ( SWOT ) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์	✓	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

คำชี้แจง : แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นโดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานปีละ 1 ครั้ง

\*\*\*\*\*

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
2. รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2563

3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และจำนวนโครงการที่นำไปปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563		โครงการที่นำไปปฏิบัติ	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
1. ด้านเศรษฐกิจ	162	328,717,000.00	53	45,491,000.00
2. ด้านคุณภาพชีวิต	110	63,950,000.00	51	20,493,541.00
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	10	5,080,000.00	4	530,000.00
4. ด้านการบริหารจัดการ	21	3,395,000.00	10	1,943,000.00
รวม	303	401,142,000.00	118	68,457,541.00

## 4. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
<b>1. ด้านเศรษฐกิจ รวม</b>	<b>53</b>	<b>33</b>	<b>62.26%</b>	<b>16</b>	<b>30.19%</b>	<b>4</b>	<b>7.55%</b>		
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา	33	26		6		1			
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน	16	6		10					
1.3 แผนงานการเกษตร	4	1				3			

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ มี 3 แผนงาน คือ แผนงานอุตสาหกรรมโยธา แผนงานเคหะและชุมชน และแผนงานการเกษตร มีโครงการทั้งหมด 53 โครงการ จำนวนโครงการที่เสร็จ จำนวน 33 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 62.26 จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 30.19 จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.55

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
<b>2. ด้านคุณภาพชีวิต รวม</b>	<b>51</b>	<b>37</b>	<b>72.54%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>11</b>	<b>21.57%</b>	<b>3</b>	<b>5.89%</b>
2.1 แผนงานการศึกษา	19	15		-		1		3	
2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	11	8		-		3		-	
2.3 แผนงานสาธารณสุข	3	2		-		1		-	
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์	7	4		-		3		-	
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	7	5		-		2		-	
2.6 แผนงานรักษาความสงบภายใน	4	3		-		1		-	

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต มี 6 แผนงาน มีโครงการทั้งหมด 51 โครงการ จำนวนโครงการที่เสร็จ จำนวน 37 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 72.54 และจำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.57 และมีโครงการที่ยกเลิก จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.89

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก	
	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
<b>3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	4	2	50.00%	0	0.00%	2	50.00%	0	0.00%
3.1 แผนงานการเกษตร(งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้)	2	1		-		1			
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน(งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)	2	1		-		1			
จากตารางข้างต้นจะเห็นว่ายุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี 2 แผนงาน มีโครงการทั้งหมด 4 โครงการ จำนวนโครงการที่เสร็จ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50 และจำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50									

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก	
	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
<b>4. ด้านการบริหารจัดการ</b>									
<b>รวม</b>	10	7	70.00%	0	0.00%	3	30.00%	0	0.00%
4.1 แผนงานบริหารทั่วไป	10	7		-		3		0	
จากตารางข้างต้นจะเห็นว่ายุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ มีโครงการทั้งหมด 10 โครงการ จำนวนโครงการที่เสร็จ จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 64.29 จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 30.00									
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	118	79	66.95%	16	13.56%	20	16.95%	3	2.54%

สรุปโดยรวม จากตารางข้างต้นจะเห็นว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลหน้าเขา มีการดำเนินโครงการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามยุทธศาสตร์ 4 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านคุณภาพชีวิต ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการบริหารจัดการ มีโครงการทั้งหมด จำนวน 118 โครงการ มีจำนวนโครงการที่เสร็จ จำนวน 79 โครงการคิดเป็นร้อยละ 66.95 จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.56 จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.95 และโครงการที่มีการยกเลิก จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.54

## 5. งบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

### 5.1. งบประมาณรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา มีงบประมาณรายจ่าย ในปี พ.ศ.2563 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 63,210,541 บาท แยกเป็นงบประมาณตามข้อบัญญัติ ปี 2563 จำนวน 29,266,240 บาท รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2562 จำนวน 3,398,900 บาท จ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 3,549,000 บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 21,250,401 บาท และเงินทุนสำรอง จำนวน 5,746,000 บาท ปรากฏดังตาราง

ยุทธศาสตร์	งบข้อบัญญัติ ปี 2563	รายจ่ายค้าง จ่าย ปี 2562	จ่ายขาดเงิน สะสม	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	เงินทุนสำรอง	รวม
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
1. ด้านเศรษฐกิจ	6,906,100.00	3,398,900.00	3,549,000.00	20,644,000.00	5,746,000.00	40,244,000.00
2. ด้านคุณภาพชีวิต	19,887,140.00	-	-	606,401.00	-	20,493,541.00
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	530,000.00	-	-	-	-	530,000.00
4. ด้านการบริหารจัดการ	1,943,000.00	-	-	-	-	1,943,000.00
รวม	29,266,240.00	3,398,900.00	3,549,000.00	21,250,401.00	5,746,000.00	63,210,541.00

### 5.2 การเบิกจ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปี พ.ศ.2563 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมจำนวน 45,660,982.36 บาท แยกเป็นงบประมาณตามข้อบัญญัติ ปี 2563 จำนวน 23,399,726.42 บาท รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2562 จำนวน 3,398,900.00 บาท จ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 2,956,355.22 บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 13,036,001.00 บาท และเงินทุนสำรอง จำนวน 2,870,000.00 บาท ปรากฏดังตาราง

ยุทธศาสตร์	งบข้อบัญญัติ ปี 2563	รายจ่ายค้าง จ่าย ปี 2562	เงินสะสม	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	เงินทุนสำรอง	รวม
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
1. ด้านเศรษฐกิจ	4,649,789.37	3,398,900.00	2,956,355.22	12,948,000.00	2,870,000.00	26,823,044.59
2. ด้านคุณภาพชีวิต	17,368,472.30	-	-	88,001.00	-	17,456,473.02
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	360,500.00	-	-	-	-	360,500.00
4. ด้านการบริหารจัดการ	1,020,964.75	-	-	-	-	1,020,964.75
รวม	23,399,726.42	3,398,900.00	2,956,355.22	13,036,001.00	2,870,000.00	45,660,982.36

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

6. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2563

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ทำสัญญา	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยใหม่พัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าเขา (2,950 เมตร)	✓			9,960,000.00	8,250,000.00	
2	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตผิวจราจร หมู่ที่ 2 บ้านถ้ำโกบ หมู่ที่ 3 บ้านต้นพงค์ ตำบลหน้าเขา (1,530 เมตร)	✓			5,717,000.00	2,120,000.00	
3	ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นพงค์-ไรใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าเขา (1,300 เมตร)	✓			4,468,000.00	2,578,000.00	
4	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านนา-บ้านหน้าเขา หมู่ที่ 5 (2,100 เมตร)			✓	7,940,000.00		ได้ดำเนินการนำงบประมาณ อบต.หน้าเขา แก้ไขปัญหาให้ประชาชนก่อนได้รับจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง
5	ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ			✓	170,000.00		ส่งคืนโครงการ
6	ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาติน			✓	170,000.00		ส่งคืนโครงการ
7	ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้ว			✓	170,000.00		ส่งคืนโครงการ
8	การปรับปรุงภูมิทัศน์ถ้ำวิมานเมฆ (ก่อสร้างประตูทางเข้า และวางท่อระบายน้ำ)			✓	2,566,000.00		ส่งคืนโครงการ พื้นที่ก่อสร้างอยู่ในเขตป่าไม้ไม่สามารถดำเนินการได้

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ (ส่งคืน) โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ทำสัญญา	หมายเหตุ
9	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก โรงเรียนบ้านห้วยน้ำ แก้ว	✓			30,700.00	26,500.00	
10	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ	✓			30,700.00	26,500.00	
11	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำ หน้ากากอนามัยในโครงการ พลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัส โคโรนา (COVID - ๑๙)	✓			35,001.00	35,001.00	
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านนายคล้าย- นาย จิตร หมู่ที่ 3 (190 เมตร)		✓		499,000.00	498,000.00	
	รวมทั้งสิ้น				<u>31,756,401.00</u>	<u>13,534,001.00</u>	

#### ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1. งบประมาณมีจำนวนจำกัด โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อแก้ปัญหาประชาชนได้น้อย
2. การดำเนินการบางโครงการล่าช้าหรือไม่ได้ดำเนินการ ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ เป็นเพราะประสบปัญหาโรคระบาดระหว่างปี

## การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ

### ๑. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านนา-หน้าเขา หมู่ ๕, หมู่ ๑

ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน โดยกำหนดเกณฑ์ตัวชี้วัดคุณค่าโครงการ ๕ ตัวชี้วัด ได้แก่ ค่าใช้จ่าย  
ระยะเวลาดำเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์

ปรากฏผลประเมินดังนี้

#### ๑.๑ ค่าใช้จ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ได้ใช้งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำนวน ๒,๘๗๐,๐๐๐ บาท เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ซ่อมแซมถนนลาดยางด้วยการปะซ่อมผิวจราจรเดิม และปูผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับใหม่ ระยะทาง ๑,๙๙๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๙๒๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร

จากการประเมินค่าใช้จ่ายเห็นว่ามีมูลค่าคุ้มค่างบประมาณที่ได้รับ โดยกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างไว้จำนวน ๕,๒๘๙,๘๗๙.๓๕ บาท หักหุ้นส่วนจำกัด ไทศาลเมืองทอง ได้รับการคัดเลือก โดยเสนอราคา เป็นเงิน ๒,๘๗๐,๐๐๐ บาท ต่ำกว่าราคากลางที่กำหนดไว้

#### ๑.๒ ระยะเวลาดำเนินการ

ในสัญญาจ้างได้กำหนดเวลาการก่อสร้างเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นเวลา ๙๐ วัน หักหุ้นส่วนจำกัด ไทศาลเมืองทอง ได้ส่งมอบงานจ้าง วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ จากการประเมินระยะเวลาดำเนินการปรากฏว่าการก่อสร้างเสร็จทันตามเวลาที่กำหนด

#### ๑.๓ ผลผลิต

ตามสัญญาซ่อมแซมถนนลาดยางด้วยการปะซ่อมผิวจราจรเดิม และปูผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับใหม่ ระยะทาง ๑,๙๙๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๙๒๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร จากการประเมินผลผลิตมีปริมาณและลักษณะครบตามสัญญา

#### ๑.๔ ผลลัพธ์

จากการประเมินเห็นว่าถนนได้รับการปะซ่อมผิวจราจรและลาดยางขนาดพื้นที่ตามแบบแปลนสัญญา ถนนสายนี้มีประชาชนสัญจรไปมาจำนวนมาก เป็นแหล่งชุมชน เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างถนนในหมู่บ้าน

## ๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑

ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน โดยกำหนดเกณฑ์ตัวชี้วัดคุณค่าโครงการ ๔ ตัวชี้วัด ได้แก่ ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาดำเนินการ ผลผลิต และผลลัพธ์

ปรากฏผลประเมินดังนี้

### ๑.๑ ค่าใช้จ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๙,๙๖๐,๐๐๐ บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๕๘๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๙๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร

จากการประเมินค่าใช้จ่ายเห็นว่ามีมูลค่ากับประโยชน์ที่ได้รับ โดยกำหนดราคากลาง ค่าก่อสร้างไว้จำนวน ๘,๔๔๑,๙๖๒.๑๑ บาท โดยหักหุ้นส่วนจำกัด เอียดบัวการโยธา เสนอวงเงินค่าก่อสร้าง จำนวน ๘,๒๕๐,๐๐๐ บาท ต่ำกว่าราคากลางที่กำหนดไว้

### ๑.๒ ระยะเวลาดำเนินการ

ในสัญญาจ้างได้กำหนดเวลาการก่อสร้างเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นเวลา ๑๒๐ วัน หักหุ้นส่วนจำกัด เอียดบัวการโยธา ได้ส่งมอบงานจ้าง วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ จากการประเมินระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน ปรากฏว่าการก่อสร้างเสร็จทันตามเวลาที่กำหนด

### ๑.๓ ผลผลิต

ตามสัญญาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๕๘๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๙๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร

จากการประเมินผลผลิตมีปริมาณและลักษณะครบตามสัญญา

### ๑.๔ ผลลัพธ์

จากการประเมินเห็นว่าก่อสร้างถนน คสล.สายซอยใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑ ก่อสร้างเสร็จตามแบบแปลนสัญญา ประชาชนสามารถใช้สัญจรไปมาได้สะดวก

### ๓. โครงการก่อสร้างและบุกเบิกถนนลูกรังสายบ้านนายสุชาติ-นายเจริญ หมู่ที่ ๗

ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน โดยกำหนดเกณฑ์ตัวชี้วัดคุณค่าโครงการ ๔ ตัวชี้วัด ได้แก่ ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาดำเนินการ ผลผลิต และผลลัพธ์

ปรากฏผลประเมินดังนี้

#### ๑.๑ ค่าใช้จ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ไว้จำนวน ๔๓๐,๐๐๐ บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและบุกเบิกถนนให้มีความกว้างโดยเฉลี่ยของถนน ๕ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร

จากการประเมินค่าใช้จ่ายเห็นว่ามีมูลค่ากับประโยชน์ที่ได้รับ โดยกำหนดราคากลาง ค่าก่อสร้างไว้จำนวน ๔๓๐,๐๐๐ บาท ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา คือ ร้าน เค.เอส.ปาล์ม ๕ เสนอวงเงินค่าก่อสร้าง จำนวน ๔๒๙,๕๐๐ บาท ต่ำกว่าราคากลางที่กำหนด

#### ๑.๒ ระยะเวลาดำเนินการ

ในสัญญาจ้างได้กำหนดเวลาการก่อสร้างเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นเวลา ๔๕ วัน ร้าน เค.เอส.ปาล์ม ๕ ได้ส่งมอบงานจ้าง วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

จากการประเมินระยะเวลาดำเนินการ ปรากฏว่าการก่อสร้างเสร็จทันตามเวลาที่กำหนด

#### ๑.๓ ผลผลิต

ตามสัญญาก่อสร้างและบุกเบิกถนนให้มีความกว้างโดยเฉลี่ยของถนน ๕ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร

จากการประเมินผลผลิตมีปริมาณและลักษณะครบตามสัญญา

#### ๑.๔ ผลลัพธ์

จากการประเมินเห็นว่าก่อสร้างและบุกเบิกถนนลูกรังสายบ้านนายสุชาติ-นายเจริญ หมู่ที่ ๗ ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนสายนี้ สัญจรไปมาพอสมควร

#### ๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไรใต้ หมู่ที่ ๓

ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน โดยกำหนดเกณฑ์ตัวชี้วัดคุณค่าโครงการ ๔ ตัวชี้วัด ได้แก่ ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาดำเนินการ ผลผลิต และผลลัพธ์

ปรากฏผลประเมินดังนี้

##### ๑.๑ ค่าใช้จ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ไร่จำนวน ๔,๕๖๘,๐๐๐ บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้ได้ความกว้างผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑,๓๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ ตารางเมตร

จากการประเมินค่าใช้จ่ายเห็นว่ามีค่าคุ้มค่ากับประโยชน์ที่ได้รับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอียดบัวการโยธา เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องและตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๒,๕๘๗,๐๐๐ บาท

##### ๑.๒ ระยะเวลาดำเนินการ

ในสัญญาจ้างได้กำหนดเวลาการก่อสร้างเริ่มตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นเวลา ๙๐ วัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอียดบัวการโยธา ได้ส่งมอบงานจ้าง วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

จากการประเมินระยะเวลาดำเนินการ ปรากฏว่าการก่อสร้างเสร็จทันตามเวลาที่กำหนด

##### ๑.๓ ผลผลิต

ตามสัญญาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้ได้ความกว้างผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑,๓๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ ตร.ม. จากการประเมินผลผลิตมีปริมาณและลักษณะครบตามสัญญา

##### ๑.๔ ผลลัพธ์

จากการประเมินเห็นว่าถนนมีความหนา กว้าง และผิวจราจรได้มาตรฐาน ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนสายนี้ มีความสะดวกและปลอดภัย มีประชาชนใช้สัญจรไปมาพอสมควร

## ๕. โครงการก่อสร้างและบุกเบิกถนนลูกรังสายคลองท่อม - อ่าวลำแพน หมู่ที่ ๘

ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน โดยกำหนดเกณฑ์ตัวชี้วัดคุณค่าโครงการ ๔ ตัวชี้วัด ได้แก่ ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาดำเนินการ ผลผลิต และผลลัพธ์

ปรากฏผลประเมินดังนี้

### ๑.๑ ค่าใช้จ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ไว้จำนวน ๔๘๓,๐๐๐ บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและบุกเบิกถนนให้มีความกว้างโดยเฉลี่ยของถนน ๕ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร

จากการประเมินค่าใช้จ่ายเห็นว่ามีความคุ้มค่ากับประโยชน์ที่ได้รับ โดยกำหนดราคากลาง ค่าก่อสร้างไว้จำนวน ๔๘๓,๐๐๐ บาท ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา คือ บริษัท สิริพัฒน์ ๒๕๑๘ จำกัด เสนอวงเงินค่าก่อสร้าง ๔๘๒,๐๐๐ บาท ต่ำกว่าราคากลางที่กำหนด

### ๑.๒ ระยะเวลาดำเนินการ

ในสัญญาจ้างได้กำหนดเวลาการก่อสร้างเริ่มตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นเวลา ๔๕ วัน บริษัท สิริพัฒน์ ๒๕๑๘ จำกัด ได้ส่งมอบงานจ้าง วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓

จากการประเมินระยะเวลาดำเนินการ ปรากฏว่าการก่อสร้างเสร็จทันตามเวลาที่กำหนด

### ๑.๓ ผลผลิต

ตามสัญญาก่อสร้างและบุกเบิกถนนให้มีความกว้างโดยเฉลี่ยของถนน ๕ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร

จากการประเมินผลผลิตมีปริมาณและลักษณะครบตามสัญญา

### ๑.๔ ผลลัพธ์

จากการประเมินเห็นว่าถนนมีความหนา กว้าง และผิวจราจรได้มาตรฐาน ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนสายนี้ มีความสะดวกและปลอดภัย มีประชาชนใช้สัญจรไปมาพอสมควร

แบบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	แหล่งงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยใหม่พัฒนา หมู่ที่ 1	487,500	486,500	✓				ข้อบัญญัติ ปี 63	กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยใหม่พัฒนา หมู่ที่ 1 (ต่อเนื่อง)	183,000			✓			ข้อบัญญัติ ปี 63	กองช่าง	กันเงินรายจ่ายก่อนนี้ผูกพัน
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นพงษ์ - บ่อช้าง หมู่ที่ 3	494,000	493,000	✓				ข้อบัญญัติ ปี 63	กองช่าง	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางสร้าน - หน้าเขา (บ้านนายสุนันท์) หมู่ที่ 2	416,000	415,000	✓				ข้อบัญญัติ ปี 63	กองช่าง	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยน้ำแก้ว - สวนเหนือ ม. 6	499,000	498,000	✓				ข้อบัญญัติ ปี 63	กองช่าง	
6	โครงการก่อสร้างและบุกเบิกถนนสายคลองท่อมัง - อ่าวลำแพน หมู่ที่ 8	483,000	482,000	✓				ข้อบัญญัติ ปี 63	กองช่าง	
7	โครงการก่อสร้างและบุกเบิกถนนสายบ้านนายนิพนธ์ - ถนนลาดยางสายเขาแก้วควนทัง หมู่ที่ 4	756,000	695,000	✓				ข้อบัญญัติ ปี 63	กองช่าง	
8	โครงการก่อสร้างและบุกเบิกถนนสายบ้านนายประภาส - ควนทังทัง หมู่ที่ 5	317,000	311,500	✓				ข้อบัญญัติ ปี 63	กองช่าง	
9	โครงการก่อสร้างและบุกเบิกถนนสายบ้านนายสุชาติ - นายเจริญ หมู่ที่ 7	435,000	429,500	✓				ข้อบัญญัติ ปี 63	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	แหล่งงบ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
10	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.หน้าเขา หมู่ที่ 2	900,000			✓			ข้อบัญญัติ ปี 63	กองช่าง	กันเงินรายจ่าย ก่อนนี้ผูกพัน
11	โครงการพัฒนาประปาหมู่บ้าน	195,000			✓			ข้อบัญญัติ ปี 63	กองช่าง	กันเงินรายจ่าย ก่อนนี้ผูกพัน
12	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหน้าเขา - ควนกอ ม.1	211,000	210,500	✓				จ่ายขาดเงินสะสม	กองช่าง	
13	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองปราบ - ควนฝิ่ง ม. 2	263,000	262,500	✓				จ่ายขาดเงินสะสม	กองช่าง	
14	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองปราบ - ทางลงประปา ม.2	42,000	41,500	✓				จ่ายขาดเงินสะสม	กองช่าง	
15	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายตันยุง - คลองทิมมิ่ง ม.4	313,000	312,000	✓				จ่ายขาดเงินสะสม	กองช่าง	
16	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทุ่งคอก - ปลายคลอง ม.5	306,000	305,500	✓				จ่ายขาดเงินสะสม	กองช่าง	
17	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายเขาดิน - เขาวัวพลัด ม.8	228,000	228,000	✓				จ่ายขาดเงินสะสม	กองช่าง	
18	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายเขาวัวพลัด - คลองทิมมิ่ง ม. 8	153,000	153,000	✓				จ่ายขาดเงินสะสม	กองช่าง	
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขอยราชครู ม. 1	497,000	485,355.22	✓				จ่ายขาดเงินสะสม	กองช่าง	
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยน้ำแก้ว - มัสยิด ม. 6	466,000	464,500	✓				จ่ายขาดเงินสะสม	กองช่าง	
21	โครงการก่อสร้างและบุกเบิกลูกรังสายห้วยน้ำแก้ว - ควนฝิ่ง ม.6	216,000	215,500	✓				จ่ายขาดเงินสะสม	กองช่าง	
22	โครงการปรับปรุงและขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 (รร.บ้านควนฝิ่ง	152,000	152,000	✓				จ่ายขาดเงินสะสม	กองช่าง	
23	โครงการปรับปรุงและขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	150,000			✓			จ่ายขาดเงินสะสม	กองช่าง	กันเงินรายจ่าย ก่อนนี้ผูกพัน
24	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 5	173,000				✓		จ่ายขาดเงินสะสม	กองช่าง	ไม่มีผู้เสนอราคา
25	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 7	127,000	126,000	✓				จ่ายขาดเงินสะสม	กองช่าง	
26	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 5	252,000			✓			จ่ายขาดเงินสะสม	กองช่าง	กันเงินรายจ่าย ก่อนนี้ผูกพัน
27	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไรใต้ หมู่ที่ 3	4,468,000	2,578,000	✓				เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	กองช่าง	
28	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขอยใหม่พัฒนา หมู่ที่ 1	9,960,000	8,250,000	✓				เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	แหล่งงบ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
29	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านลำโพง - บ้านต้นพวง หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓	5,717,000	2,120,000	✓				เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	กองช่าง	
30	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายคล้าย- นายจิตร หมู่ที่ ๓	499,000			✓			เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	กองช่าง	กันเงินรายจ่าย ก่อนนี้ยกพัน
31	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านนา - หน้าเขา หมู่ที่ 5	5,746,000	2,870,000	✓				เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	กองช่าง	
32	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	94,900	94,900	✓				เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	กองช่าง	
33	ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตสายหัวน้ำแก้ว ม.6 - บ้านต้นหาร ม.7 (งวดที่ 1) ชั้น พื้นทาง	2,890,000	2,890,000	✓				งบค้ำจ่ายปี 62	กองช่าง	
	รวม	38,089,400.00	25,569,755.22					งบค้ำจ่ายปี 62	กองช่าง	

## ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

### 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

1	โครงการซ่อมแซมไฟแสงสว่างสองข้างทาง หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 8	180,000	180,000	✓				งบค้ำจ่ายปี 62	กองช่าง	
2	โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนตำบล	234,000	234,000	✓				งบค้ำจ่ายปี 62	กองช่าง	
3	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องทางสาธารณะถนนสายหน้าเขา-บ้านนา หมู่ที่ 5	515,000	514,689.37	✓				งบค้ำจ่ายปี 62	กองช่าง	
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							ข้อบัญญัติ ปี 63	การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคเขาพนม	
4	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายทุ่งผักไห่-ควนไผ่ลาย ม.1	78,000			✓			ข้อบัญญัติ ปี 63	กองช่าง	กันเงินรายจ่าย ก่อนนี้ยกพัน
5	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลองปราบ - หาดยูง ม.2	99,000			✓			ข้อบัญญัติ ปี 63	กองช่าง	"
6	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายหน้าเขา - บางสร้อย ม.2	45,000			✓			ข้อบัญญัติ ปี 63	กองช่าง	"
7	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายหน้าเขา - ควนปริง ม.2	76,000			✓			ข้อบัญญัติ ปี 63	กองช่าง	"
8	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายนางจำเนียร- ช้องพอ ม.3	59,000			✓			ข้อบัญญัติ ปี 63	กองช่าง	"
9	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายอู่ช้างแดง - บ้านนายสมพร ม.3	54,000			✓			ข้อบัญญัติ ปี 63	กองช่าง	"
10	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายลุมพล - เขาติน ม.3	65,000			✓			ข้อบัญญัติ ปี 63	กองช่าง	"

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	แหล่งงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
11	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายอ่าวลำแพน - ห้วยคอกหมู ม.8	210,000			✓			ข้อบัญญัติ ปี 63	กองช่าง	กันเงินรายจ่ายก่อนนี้ผูกพัน
12	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายอ่าวลำแพน - เขตชัยบุรี ม.8	59,800			✓			ข้อบัญญัติ ปี 63	กองช่าง	"
13	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายต้นหาร - คลองเนียง ม.7	93,000			✓			ข้อบัญญัติ ปี 63	กองช่าง	"
14	ซ่อมแซม/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านนายสมคิด) ม.6	9,300	9,300	✓				ข้อบัญญัติ ปี 63	กองช่าง	
15	ซ่อมแซม/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (กลุ่มควนกรวด) ม.3	37,500	37,500	✓				ข้อบัญญัติ ปี 63	กองช่าง	
16	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านถ้ำโกบ - ต้นพงษ์ ม. 2,3 (ต่อเนื่อง)	99,000	99,000	✓				ข้อบัญญัติ ปี 63	กองช่าง	
	รวม	1,913,600.00	1,074,489.37							

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

1.3 แผนงานการเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร)

1	ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง	216,000	178,800	✓				ข้อบัญญัติ ปี 63	สำนักปลัด	
2	โครงการปลูกป่าและหญ้าแฝกในวันสำคัญ	10,000				✓		ข้อบัญญัติ ปี 63	สำนักปลัด	
3	โครงการสนับสนุนกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริของโรงเรียนในตำบลหน้าเขา	15,000				✓		ข้อบัญญัติ ปี 63	สำนักปลัด	
4	โครงการอบรมให้ความรู้เพิ่มทักษะการทำเกษตรทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกรผู้สนใจตำบลหน้าเขา	10,000				✓		ข้อบัญญัติ ปี 63	สำนักปลัด	
	รวม	241,000.00	178,800.00							

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	แหล่งงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
----------	-----------------	--------------------	---------------------	-----------	----------------------	-----------------	---------------	---------------	-----------------------	----------

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

1	โครงการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหน้าเขา	20,000	14,715	✓				ข้อบัญญัติ ปี 63	กองการศึกษา	
2	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	50,000	48,066	✓				ข้อบัญญัติ ปี 63	กองการศึกษา	
3	โครงการศึกษาดูงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา	50,000	37,004	✓				ข้อบัญญัติ ปี 63	กองการศึกษา	
4	โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์	21,000	20,390	✓				ข้อบัญญัติ ปี 63	กองการศึกษา	
5	โครงการส่งเสริมวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	10,000					✓	ข้อบัญญัติ ปี 63	กองการศึกษา	
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา									
6	ค่าจัดหาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	940,000	837,120	✓				ข้อบัญญัติ ปี 63	กองการศึกษา	
7	ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	300,000	284,750	✓				ข้อบัญญัติ ปี 63	กองการศึกษา	
8	ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	125,000	106,220	✓				ข้อบัญญัติ ปี 63	กองการศึกษา	
9	โครงการอบรมทำวิจัยในชั้นเรียน	10,000	3,900	✓						
10	โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับ ศพด.	330,000	316,466.56	✓				ข้อบัญญัติ ปี 63	กองการศึกษา	
11	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในพื้นที่ สำหรับเด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6	1,800,000	1,667,478.16	✓				ข้อบัญญัติ ปี 63	กองการศึกษา	
12	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเขาติน	1,292,000	1,136,000	✓				ข้อบัญญัติ ปี 63	กองการศึกษา	
13	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านถ้าโภบ	1,900,000	1,684,000	✓				ข้อบัญญัติ ปี 63	กองการศึกษา	
14	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน <i>วัดบ้านแก้ว</i>	692,000	642,000	✓				ข้อบัญญัติ ปี 63	กองการศึกษา	
15	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้าโภบ	30,700	26,500	✓				เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	กองการศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	แหล่งงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
16	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำแก้ว	30,700	26,500	✓				เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	กองการศึกษา	
17	ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำโกบ	170,000					✓	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	กองการศึกษา	ช่วงโควิดปัญหาผู้รับจ้างและระยะเวลาดำเนินการ
18	ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำเขาติน	170,000					✓	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	กองการศึกษา	
19	ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำแก้ว	170,000					✓	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	กองการศึกษา	
	รวม	8,111,400.00	6,851,109.72							

## ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

### 2.2 แผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ/ส่งเสริมการท่องเที่ยว)

1	อุดหนุนคณะกรรมการมัสยิตดาร์ลุเอียะซาน (บ้านห้วยน้ำแก้ว)	10,000	10,000	✓				ข้อบัญญัติ ปี 63	กองการศึกษา	
2	ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ	200,000	111,593	✓				ข้อบัญญัติ ปี 63	กองการศึกษา	
3	ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักในตำบล	300,000						ข้อบัญญัติ ปี 63	กองการศึกษา	
4	โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนหน้าเขา	96,140				✓		ข้อบัญญัติ ปี 63	กองการศึกษา	
5	โครงการสืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบ	20,000		✓				ข้อบัญญัติ ปี 63	กองการศึกษา	
6	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู/สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	20,000	12,360	✓				ข้อบัญญัติ ปี 63	กองการศึกษา	ไม่ใช้งบ
7	โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข	10,000	5,387	✓				ข้อบัญญัติ ปี 63	กองการศึกษา	
8	โครงการภูมิปัญญาของแผ่นดินสู่การทำกินที่พอเพียง	20,000	8,100	✓				ข้อบัญญัติ ปี 63	กองการศึกษา	
9	โครงการรอมฎอนสัมพันธ์	20,000						ข้อบัญญัติ ปี 63	กองการศึกษา	
10	งานประเพณีวันเข้าพรรษา	5,000	2,920	✓			✓	ข้อบัญญัติ ปี 63	กองการศึกษา	
11	โครงการอบรมแกนนำเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนตำบลหน้าเขา	10,000		✓				ข้อบัญญัติ ปี 63	กองการศึกษา	
	รวม	711,140.00	150,360.00					ข้อบัญญัติ ปี 63	กองการศึกษา	ไม่ใช้งบ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	แหล่งงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
----------	-----------------	--------------------	---------------------	-----------	----------------------	-----------------	---------------	---------------	-----------------------	----------

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

2.3 แผนงานสาธารณสุข

1	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	36,000	28,050	✓				ข้อบัญญัติ ปี 63	สำนักปลัด	
2	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	160,000				✓		ข้อบัญญัติ ปี 63	สำนักปลัด	
3	โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (จัดทำหน้ากากผ้า)	35,001	35,001	✓				เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	สำนักปลัด	
	รวม	231,001.00	63,051.00							

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

1	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาส	20,000				✓		ข้อบัญญัติ ปี 63	สำนักปลัด	
2	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	20,000	16,500	✓				ข้อบัญญัติ ปี 63	สำนักปลัด	
3	โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ HIV ในชุมชนตำบลหน้าเขา	20,000				✓		ข้อบัญญัติ ปี 63	สำนักปลัด	
4	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,400,000	7,523,600	✓				ข้อบัญญัติ ปี 63	สำนักปลัด	
5	เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,520,000	2,520,000	✓				ข้อบัญญัติ ปี 63	สำนักปลัด	
6	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	71,000	71,000	✓				ข้อบัญญัติ ปี 63	สำนักปลัด	
7	โครงการ "สืบรด สายร้อย ร้อยใจกตัญญู"	50,000				✓		ข้อบัญญัติ ปี 63	สำนักปลัด	
	รวม	11,101,000.00	10,131,100.00							

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	แหล่งงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
----------	-----------------	--------------------	---------------------	-----------	----------------------	-----------------	---------------	---------------	-----------------------	----------

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	10,000		✓				ข้อบัญญัติ ปี 63	สำนักปลัด	ไม่ใช้งบ
2	โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	15,000				✓		ข้อบัญญัติ ปี 63	สำนักปลัด	
3	โครงการส่งเสริมความรักและความอบอุ่นในครอบครัว	20,000				✓		ข้อบัญญัติ ปี 63	สำนักปลัด	
4	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	30,000	27,800	✓				ข้อบัญญัติ ปี 63	สำนักปลัด	
5	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี	20,000	12,550	✓				ข้อบัญญัติ ปี 63	สำนักปลัด	
6	โครงการอบรมพัฒนากลุ่มอาชีพ	20,000	18,160	✓				ข้อบัญญัติ ปี 63	สำนักปลัด	
7	อุดหนุนโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.แห่งประเทศไทย)	12,000	12,000	✓				ข้อบัญญัติ ปี 63	สำนักปลัด	
		127,000.00	70,510.00					ข้อบัญญัติ ปี 63	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

2.6 แผนงานรักษาความสงบภายใน

1	โครงการดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์	10,000				✓		ข้อบัญญัติ ปี 63	สำนักปลัด	
2	โครงการดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่	10,000	7,725	✓				ข้อบัญญัติ ปี 63	สำนักปลัด	
3	โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ	142,000	138,772	✓				ข้อบัญญัติ ปี 63	สำนักปลัด	
4	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(นโยบายรัฐ)	50,000	43,845.30	✓				ข้อบัญญัติ ปี 63	สำนักปลัด	
	รวม	212,000.00	190,342.30							

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	แหล่งงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
----------	-----------------	--------------------	---------------------	-----------	----------------------	-----------------	---------------	---------------	-----------------------	----------

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.1 แผนงานการเกษตร(งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้)

1	กิจกรรมป้องกันไฟป่า	10,000				✓		ข้อบัญญัติ ปี 63	สำนักปลัด	
2	กิจกรรมปลูกต้นไม้ รั้วน้ำ รั้วป่า	20,000		✓				ข้อบัญญัติ ปี 63	สำนักปลัด	
	รวม	30,000	-							ไม่ใช้งบ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

1	ปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย	500,000	360,500	✓				ข้อบัญญัติ ปี 63	กองช่าง	
2	โครงการจัดซื้อถังขยะรีไซเคิล และถังขยะอันตราย	15,000			✓			ข้อบัญญัติ ปี 63	สำนักปลัด	กันเงินรายจ่ายก่อนนี้ผูกพัน
	รวม	500,000	360,500							

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

4.1 แผนงานบริหารทั่วไป

1	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	600,000				✓		ข้อบัญญัติ ปี 63	สำนักปลัด	
2	โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน	15,000	6,735	✓				ข้อบัญญัติ ปี 63	กองช่าง	
3	โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา	205,000	204,550	✓				ข้อบัญญัติ ปี 63	สำนักปลัด	
4	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	135,000	95,000	✓				ข้อบัญญัติ ปี 63	กองคลัง	
5	โครงการสำรวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการของ อบต.หน้าเขา	25,000	25,000	✓				ข้อบัญญัติ ปี 63	สำนักปลัด	
6	โครงการสนับสนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่	20,000	20,000	✓				ข้อบัญญัติ ปี 63	สำนักปลัด	
7	โครงการวางและปรับปรุงผังเมือง	10,000								
8	โครงการสำรวจตรวจสอบและจัดทำแนวเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000						ข้อบัญญัติ ปี 63	กองช่าง	
								ข้อบัญญัติ ปี 63	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	แหล่งงบ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
9	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง สมาชิกสภาฯ	560,000	410,701.30	✓				ข้อบัญญัติ ปี 63	สำนักปลัด, กองคลัง, กองศึกษา, กองช่าง	
10	โครงการบริหารจัดการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	363,000	258,978.45	✓				ข้อบัญญัติ ปี 63	สำนักปลัด, กองคลัง, กองศึกษา, กองช่าง	
	รวม	1,943,000.00	1,020,964.75							

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

4.2 ครุภัณฑ์

1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

1	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน 5 ตัว	12,500.00	12,500	✓				ข้อบัญญัติ ปี 63	สำนักปลัด	
2	เก้าอี้ทำงานแบบมีที่พักแขน 4 ตัว	10,000.00	10,000	✓				ข้อบัญญัติ ปี 63	กองคลัง	
3	โต๊ะทำงานพร้อมกระจก 2 ตัว	11,000.00	10,000	✓				ข้อบัญญัติ ปี 63	กองคลัง	
4	จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	21,000.00	21,000	✓				ข้อบัญญัติ ปี 63	กองศึกษา	
2. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์										
5	จอคอมพิวเตอร์ 21.5 นิ้ว	3,700.00	33,900	✓				ข้อบัญญัติ ปี 63	สำนักปลัด	
6	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,300.00	4,300	✓				ข้อบัญญัติ ปี 63	กองคลัง	
7	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	17,000.00	15,900	✓				ข้อบัญญัติ ปี 63	กองศึกษา	
8	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	2,600.00	2,490	✓				ข้อบัญญัติ ปี 63	กองศึกษา	
9	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	2,500.00	1,990	✓				ข้อบัญญัติ ปี 63	กองศึกษา	
3. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร										
10	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 3 เครื่อง	28,500.00	25,500	✓				ข้อบัญญัติ ปี 63	สำนักปลัด	
11	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	180,000.00	173,000	✓				ข้อบัญญัติ ปี 63	กองช่าง	
4. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่										

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	แหล่งงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
12	จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	18,000.00			✓			ข้อบัญญัติ ปี 63	กองช่าง	กันเงินรายจ่าย ก่อนนี้ผูกพัน
5. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ										
13	จัดซื้อล้อวัดระยะทาง	7,500.00	3,080	✓				ข้อบัญญัติ ปี 63	กองช่าง	
	รวม	318,600.00	313,660.00							

# รายงานผลการดำเนินงาน

## รายงานผลการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๓ ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ

### ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

โดยมีเป้าหมายพัฒนา คือ งานอุตสาหกรรมโยธา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ในพื้นที่ เช่น ถนน รางระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ไฟฟ้าสาธารณะ ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

#### ๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑



งบประมาณ ๘,๒๕๐,๐๐๐ บาท

#### ๒. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านนา - หน้าเขา หมู่ที่ ๕

งบประมาณ ๒,๘๗๐,๐๐๐ บาท

#### ๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไรใต้ หมู่ที่ ๓

งบประมาณ ๒,๕๗๘,๐๐๐ บาท


#### ๔.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ ๗


งบประมาณ ๑๒๖,๐๐๐ บาท

#### ๕. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องทางสาธารณะถนนสายหน้าเขา-บ้านนา หมู่ที่ ๕

งบประมาณ ๕๑๕,๐๐๐ บาท

#### ๖. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลหน้าเขา

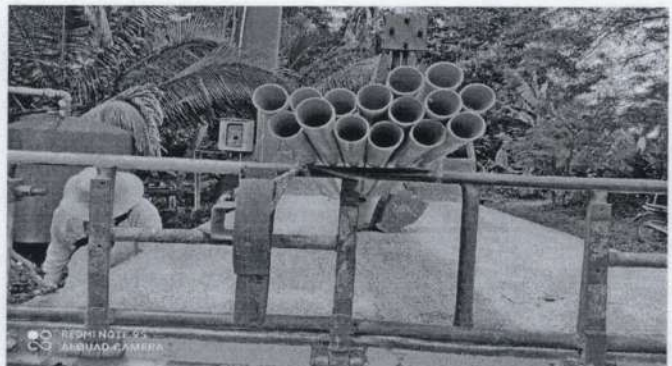

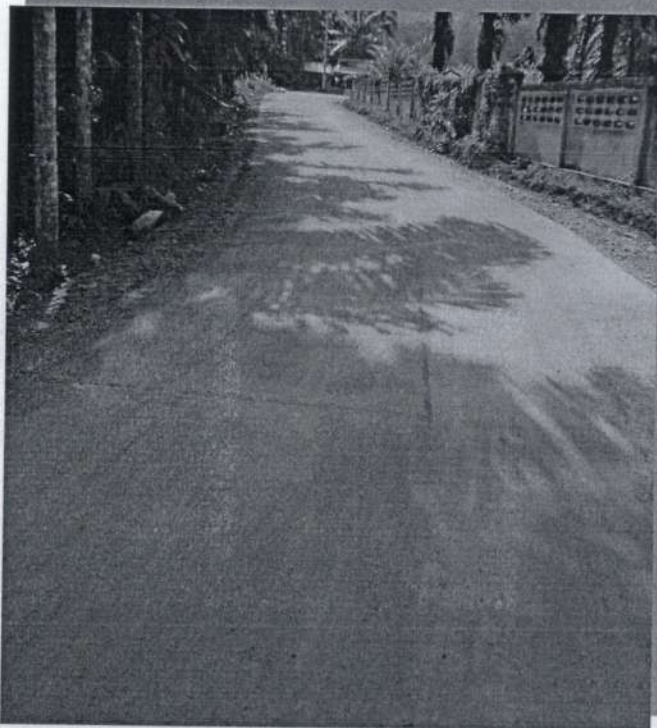

๗. โครงการก่อสร้างและบุกเบิกถนนสายบ้านนายนิพนธ์ - ถนนลาดยางสายเขาแก้ว- ควนทัง หมู่ที่ ๔  
งบประมาณ ๖๙๕,๐๐๐ บาท
๘. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านถ้ำโกบ- บ้านต้นพงษ์ ม.๒ - ม.๓  
งบประมาณ ๒,๑๒๐,๐๐๐ บาท
๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ห้วยน้ำแก้ว - มัสยิด หมู่ที่ ๖  
งบประมาณ ๔๖๔,๕๐๐ บาท
๑๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บางสร้าน - หน้าเขา (บ้านนายสุนันท์) ม. ๒  
งบประมาณ ๔๑๕,๐๐๐ บาท

### โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางสร้าน-หน้าเขา(บ้านนายสุนันท์) หมู่ที่ ๒
ปริมาณงาน	โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้ได้ความกว้าง ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร, หน้า 0.15 เมตร, ไหล่ทางสูงถึงกว้างข้างละ 0.30 เมตร ระยะทาง 128 เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร ตามรายละเอียด อบรมกำหนด
งบประมาณ	415,000.00- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
วันเริ่มสัญญา	วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้รับจ้าง	วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ 23 มีนาคม 2563
ผู้ควบคุมงาน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอียดบัวการโยธา โทรศัพท์ 081-8940074 เลขที่ 13 หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 81140 นายประสงค์ คำทอง
	คณะกรรมการตรวจงานจ้าง
	1. นายชะโอสถ ลังช่ออด
	2. นางสาวสุรชาติพย์ เกื้อกุลบุตร
	3. นางสาวเพ็ญพักตร์ ทลุ่มจิว



## ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

โดยมีเป้าหมายพัฒนา คือ โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่างๆ เช่น การพัฒนาการศึกษาทุกระดับ การสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่น การส่งเสริมด้านสาธารณสุข งานสังคมสงเคราะห์ การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รักษาความสงบภายใน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อดำเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค์ประสงค์เพื่อพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ฯลฯ

๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน (กิจกรรมอบรมภาคีเครือข่ายแกนนำสภาเด็กและเยาวชน)  
งบประมาณ ๒๗,๘๐๐ บาท
๒. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ  
งบประมาณ ๑๖,๕๐๐ บาท
๓. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี  
งบประมาณ ๑๒,๕๕๐ บาท
๔. โครงการอบรมและพัฒนากลุ่มอาชีพตำบลหน้าเขา  
งบประมาณ ๑๘,๑๖๐ บาท



- ๕. โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข
- ๖. โครงการการแข่งขันฟุตบอล “อบจ.กระบี่ คัพ” ด้านภยยาเสพ  
ติด งบประมาณ ๑๑๑,๕๙๓ บาท
- ๗. โครงการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีถวายเทียนพรรษา  
งบประมาณ ๒,๙๒๐ บาท
- ๘. โครงการอบรมแกนนำเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชน ตำบลหน้าเขา





๙. โครงการภูมิปัญญาของแผ่นดินสู่การทำกินที่พอเพียง  
งบประมาณ ๘,๑๐๐ บาท

๑๐. โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓  
งบประมาณ ๔๘,๐๖๖ บาท

๑๑. โครงการศึกษาดูงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
งบประมาณ ๓๗,๐๐๔ บาท

๑๒. โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
งบประมาณ ๑๒,๓๖๐ บาท

๑๓. โครงการอบรมการทำวิจัยในชั้นเรียน งบประมาณ ๓,๙๐๐ บาท





- ๑๔. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(นโยบายรัฐ) งบประมาณ ๔๓,๘๔๕.๓๐ บาท
- ๑๕. โครงการดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ งบประมาณ ๗,๗๒๕ บาท
- ๑๖. โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ งบประมาณ ๑๓๘,๗๗๒ บาท
- ๑๗. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณ ๒๘,๐๕๐ บาท
- ๑๘. โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (จัดทำหน้ากากผ้า งบประมาณ ๓๕,๐๐๑ บาท
- ๑๙. กิจกรรมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนกรณีได้รับ

ผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (แจกจ่ายถุงยังชีพ)

๒๐. โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น



### ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยมีเป้าหมาย การบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้ในป่าชุมชน ป่าสาธารณะ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ โครงการตามพระราชดำริฯ กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

๑. กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน"
๒. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง "ถนนสวย"
๓. โครงการคัดแยกขยะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๔. กิจกรรมอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม
- ๕.โครงการปรับปรุงที่ทิ้งขยะมูลฝอย หมู่ที่ ๖



### ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

๑. โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและสมาชิกสภา อบต.หน้าเขา
๒. โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง สมาชิกสภาฯ



